



**PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E
DESEMBOLSO**

RH Piabanha
CG INEA 069/2022

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1.1	Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	Participar das reuniões e propor encaminhamentos	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1.1	Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	Executar os encaminhamentos	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.1	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Em andamento	Articulação	190.033,71	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.2	Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Organizar VI Seminário de Saneamento e VII Encontro de Pesquisadores	Concluída	Articulação	0,00	janeiro-23	março-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.2	Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar VI Seminário de Saneamento e VII Encontro de Pesquisadores	Concluída	Execução	0,00	março-23	março-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.2	Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Capacitações 2023 - Primeira Capacitação - Organização e Realização - Abril	Em andamento	Execução	0,00	abril-23	dezembro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.2	Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Capacitações 2023 - Segunda Capacitação - Organização e Realização - Junho	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	junho-23	dezembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.2	Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Capacitações 2023 - Terceira Capacitação - Organização e Realização - Agosto	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	agosto-23	dezembro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.2	Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Capacitações 2023 - Quarta Capacitação - Organização e Realização - Outubro	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	outubro-23	dezembro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.3	Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários	Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários	Em andamento	Execução	407.926,42	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.3	Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários	ACT com INEA para viabilizar estagiários atuarem na consolidação e fortalecimento do banco de dados de Cadastro de Usuários	Em andamento	Execução	90.000,00	abril-23	dezembro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.4	Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG)	Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG)	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.5	Manter a interação com as prefeituras da área de abrangência da RH-IV, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos sistemas	Mobilizar municípios para participação efetiva no Comitê	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.5	Manter a interação com as prefeituras da área de abrangência da RH-IV, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos sistemas	Realizar reuniões bimensais do ACT Câmara Municipal de Petrópolis	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-23	dezembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.5	Manter a interação com as prefeituras da área de abrangência da RH-IV, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos sistemas	Acompanhar Plano de Trabalho do ACT Câmara Municipal de Petrópolis	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.1	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Disponibilizar recursos para custeio do CG	Em andamento	Custeio	291.261,37	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.2	Realizar a revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão	Acompanhar ação realizada pela Gerência de Planejamento Estratégico da AGEVAP	Em andamento	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.3	Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão	Contratar Especialista Administrativo	Em andamento	Custeio	0,00	abril-23	maio-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Realizar constante levantamento dos eventos e das capacitações relacionados às atividades desempenhadas pelos colaboradores	Em andamento	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Definir os colaboradores para participação no evento ou na capacitação	Aguardando outra atividade	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Participar dos eventos de treinamento e capacitação	Aguardando outra atividade	Custeio	0,00	N/A	N/A

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Receber o certificado de realização da capacitação	Aguardando outra atividade	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Acompanhar a realização das capacitações, principalmente no que tange ao atendimento das metas do CG	Aguardando outra atividade	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.1	Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na RH-IV	Analisar e discutir aspectos importantes sobre outorga em cada bacia afluyente, por meio de Plano de Trabalho e oficinas com os órgãos gestores	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.1	Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na RH-IV	Aprovar Plano de Trabalho para discussão das diretrizes da outorga para execução ser iniciada no 2º ano do PBH	Em andamento	Articulação	0,00	maio-23	dezembro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH-IV	Realizar reunião com os órgãos gestores	Em andamento	Articulação	0,00	setembro-23	outubro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH-IV	Elaborar e enviar ofício para formalização da solicitação de dados, após a reunião	Em andamento	Articulação	0,00	setembro-23	outubro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH-IV	Realizar tratamento dos dados recebidos	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	outubro-23	novembro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH-IV	Realizar a divulgação de dados e informações sobre outorga	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	novembro-23	dezembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na RH-IV, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	Realizar discussões sobre a avaliação e proposição de aperfeiçoamento da parcela de lançamento e consumo na metodologia da cobrança	Em andamento	Articulação	0,00	março-23	maio-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na RH-IV, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	Elaborar e apresentar a minuta da resolução ao órgão gestor	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	junho-23	dezembro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Elaborar o termo de referência e contratar empresa para elaboração estudo da etapa técnica propositiva do Enquadramento	Em andamento	Execução	400.000,00	A definir	A definir
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Acompanhar a contratação do estudo	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	A definir	A definir
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Aprovar Resolução - Resolução Enquadramento UCs de Proteção Integral	Em andamento	Articulação	0,00	março-23	agosto-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Encaminhar para INEA e CERHI - Resolução Enquadramento UCs de Proteção Integral	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	agosto-23	outubro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano (Parcialmente integrado)	Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento dos PBHs e PDRHs	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano (Parcialmente integrado)	Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento do PIRH-PS (GTPA)	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano (Parcialmente integrado)	Elaborar informe do andamento da execução dos PBHs e PDRHs (Ação 1.2.4.3 dos PBHs e PDRHs)	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	julho-23	julho-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano (Parcialmente integrado)	Divulgar andamento da execução dos PBHs e PDRHs	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	julho-23	julho-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano (Parcialmente integrado)	Divulgar andamento da execução do PIRH-PS	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	julho-23	julho-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH da RH-IV	Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH	Em andamento	Articulação	0,00	dezembro-23	janeiro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH da RH-IV	Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH na plenária do CBH	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	dezembro-23	março-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH da RH-IV	Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	dezembro-23	março-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH, inclusive o levantamento de novas informações	Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA	Em andamento	Articulação	50.000,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH, inclusive o levantamento de novas informações	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH, inclusive o levantamento de novas informações	Acompanhar a contratação	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH, inclusive o levantamento de novas informações	Apresentar prestação de contas do andamento do contrato nos CBHs	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	novembro-23	dezembro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.1	Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do PGR da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Elaborar e enviar o ofício aos responsáveis pela rede de monitoramento	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	maio-23	junho-23
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar tratamento dos dados recebidos	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	junho-23	dezembro-23
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar a divulgação de dados e informações sobre a rede de monitoramento	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	junho-23	dezembro-23
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar reuniões junto aos órgãos geradores de informações hidrológicas e de qualidade da água para que se automatize a divulgação das informações	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	junho-23	dezembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH	Criar grupo com a participação dos órgãos gestores para discutir o redimensionamento da rede considerando outras demandas não contempladas no Programa Monitorar	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH	Realizar reuniões do grupo	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH	Subsidiar com as informações das redes de monitoramento locais	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH	Avaliar a condição de operação da rede de monitoramento	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH	Participar das discussões acerca da rede de monitoramento	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH	Definir as necessidades de aprimoramento da rede e de rede complementar de monitoramento	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	N/A	N/A

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH	Contratar - Novo monitoramento de rios da RH-IV	Concluída	Execução	850.000,00	janeiro-23	março-23
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH	Acompanhar Contrato - Novo monitoramento de rios da RH-IV	Em andamento	Execução	0,00	janeiro-23	dezembro-23
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH	Estudar a viabilidade de assinatura de Convênio com repasse de recursos para instituição de pesquisa para monitoramento de agrotóxicos	Em andamento	Execução	1.200.000,00	março-23	junho-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH	Contratar - Monitoramento de agrotóxicos em rios da RH-IV	Aguardando definições	Execução	0,00	junho-23	outubro-23
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH	Acompanhar Contrato - Monitoramento de agrotóxicos em rios da RH-IV	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	outubro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar empresa para realização de diagnóstico sobre o esgotamento sanitário nos municípios da RH-IV	Aguardando definições	Execução	250.000,00	outubro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar - SES São José do Vale do Rio Preto	Concluída	Execução	508.941,53	janeiro-23	março-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES São José do Vale do Rio Preto	Em andamento	Execução	0,00	fevereiro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar - SES Três Rios	Concluída	Execução	323.153,24	janeiro-23	março-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Três Rios	Suspensa	Execução	0,00	fevereiro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar - SES Sapucaia	Concluída	Execução	404.519,06	janeiro-23	março-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Sapucaia	Em andamento	Execução	0,00	fevereiro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar - SES Areal	Não iniciada	Execução	250.000,00	janeiro-23	junho-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Areal	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	fevereiro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar - Gerenciadora	Em andamento	Execução	272.922,33	fevereiro-23	junho-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - Gerenciadora	Em andamento	Execução	0,00	junho-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Elaborar Edital - Protratar Rural Piabanha	Concluída	Execução	0,00	janeiro-23	junho-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Publicar Edital - Protratar Rural Piabanha	Em andamento	Execução	0,00	junho-23	agosto-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar Edital - Protratar Rural Piabanha	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	agosto-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.2	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)	Deliberar a destinação de contrapartida	Em andamento	Articulação	0,00	agosto-23	agosto-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.2	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)	Assinar o instrumento contratual com os municípios	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	dezembro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.2	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)	Transferir os recursos ao Município via Operador Financeiro	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	dezembro-23	dezembro-23
4 - Infraestrutura verde	4.1.1.2	Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	Estudar a viabilidade de realização de estudos e projetos nas áreas de preservação permanente de faixa marginal em determinados rios da Região Hidrográfica IV	Em andamento	Articulação	200.000,00	junho-23	agosto-23
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Executar os projetos de conservação e reabilitação	Aguardando outra atividade	Execução	400.000,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	N/A	N/A

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Acompanhar as ações estruturais	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Participar das ações estruturais	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Elaborar TdR e orçamento - Implantação de marcos georreferenciados e placas na delimitação da Faixa Marginal de Proteção (FMP)	Aguardando definições	Execução	0,00	maio-23	agosto-23
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Publicar Ato Convocatório - Implantação de marcos georreferenciados e placas na delimitação da Faixa Marginal de Proteção (FMP)	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Contratar - Implantação de marcos georreferenciados e placas na delimitação da Faixa Marginal de Proteção (FMP)	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Acompanhar Contrato - Implantação de marcos georreferenciados e placas na delimitação da Faixa Marginal de Proteção (FMP)	Aguardando outra atividade	Execução	0,00	N/A	N/A
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Estudar a viabilidade de mobilizar e complementar as ações na bacia do rio Vieira	Concluída	Articulação	0,00	fevereiro-23	junho-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar Acordo de Cooperação Técnica com a Fiocruz	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar Edital - PROPESQUISA RH-IV	Em andamento	Execução	0,00	janeiro-23	junho-23
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Assinar Convênio com IES vencedora - PROPESQUISA RH-IV	Aguardando cronograma	Execução	100.000,00	junho-23	setembro-23
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar desenvolvimento do projeto - PROPESQUISA RH-IV	Aguardando cronograma	Execução	0,00	junho-23	dezembro-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar as atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação	Em andamento	Articulação	5.000,00	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Elaborar relatório contendo comprovação da execução das atividades	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Apresentar relatório na plenária do CBH	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Acompanhar Contrato - Novo site	Em andamento	Articulação	12.420,00	janeiro-23	junho-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Contratar - Diagramação do Resumo Executivo do Plano de Bacia	Em andamento	Articulação	15.000,00	março-23	junho-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Contratar - Impressão e distribuição do Resumo Executivo do Plano de Bacia	Concluída	Articulação	25.200,00	junho-23	julho-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Receber exemplares, divulgação e distribuição - Impressão e distribuição do Resumo Executivo do Plano de Bacia	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	julho-23	dezembro-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.1	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Mobilizar e organizar ações de educação ambiental	Aguardando outra atividade	Articulação	18.140,84	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.1	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar ações de educação ambiental	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.1	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Publicar Ato Convocatório - Projeto de Mobilização e Educação Ambiental	Em andamento	Articulação	0,00	A definir	A definir
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.1	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Contratar - Projeto de Mobilização e Educação Ambiental	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	A definir	A definir

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.1	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Acompanhar Contrato - Projeto de Mobilização e Educação Ambiental	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	A definir	A definir

PLANEJAMENTO DE REUNIÕES

CG INEA 069/2022

RH Piabanha

Data:

02/05/2023



Instância	Mês												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Plenárias Ordinárias		1		1		1		1		1		1	6
Diretório Colegiado	1		1		1		1		1		1		6
CTIG		1		1		1			1	1		1	6
GT Plano			1		1		1					1	4
CT Mananciais		1	1		1		1		1		1		6
CT Saneamento Básico	1		1		1		1		1		1		6
GACG			1					1					2
ACT Câmara			1		1		1		1		1		5
Outras			3							1		1	5
Total	2	3	9	2	5	2	5	2	5	3	4	4	46

Limite de reuniões a serem secretariadas pela ENTIDADE DELEGATÁRIA em 2023:

50

Legenda

CTIG e GT Plano

CT Mananciais

CT Saneamento Básico

GACG - Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão

ACT Câmara - Acordo de Cooperação Técnica assinado com a Câmara Municipal de Petrópolis

RESUMO

CG INEA 069/2022

RH Piabanha


Data: 02/05/2023



Agenda	Atividades		Total
	Articulação	Execução	
1 - Gestão de Recursos Hídricos	31	9	40
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	10	5	15
3 - Saneamento Urbano e Rural	1	16	17
4 - Infraestrutura verde	2	8	10
5 - Produção de conhecimento	1	3	4
6 - Comunicação e Educação Ambiental	12	0	12
Total	57	41	98

Agenda	Comprometimento de recursos previsto (R\$)
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.429.221,50
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.050.000,00
3 - Saneamento Urbano e Rural	2.009.536,16
4 - Infraestrutura verde	600.000,00
5 - Produção de conhecimento	100.000,00
6 - Comunicação e Educação Ambiental	75.760,84
Total	6.264.518,50

Comprometimento por agenda (R\$)

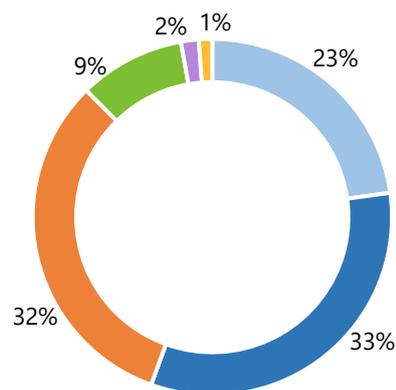

- 1 - Gestão de Recursos Hídricos
- 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
- 3 - Saneamento Urbano e Rural
- 4 - Infraestrutura verde
- 5 - Produção de conhecimento
- 6 - Comunicação e Educação Ambiental
